



LAPORAN PROGRESS PEKERJAAN PENGADAAN MEUBELAIR PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH

Periode 10 Oktober 2022 S/D 08 Desember 2022



CV IMAZA SABDA PERKASA
Jalan Brigjend Katamso No 110, Purworejo

SURAT PERJANJIAN
Nomor : 027.2/3049 Tanggal 10 OKTOBER 2022





DAFTAR ISI

Laporan Progress Pekerjaan Mingguan	2
A. Laporan Pekerjaan Minggu ke-1 dan Minggu Ke-2	2
B. Laporan Pekerjaan Minggu ke-3 dan Minggu Ke-4	4
C. Laporan Pekerjaan Minggu ke-5 dan Minggu Ke-6	6
D. Laporan Pekerjaan Minggu ke-7 dan Minggu Ke-8	8
E. Laporan Pekerjaan Minggu ke-9 dan Minggu Ke-10	10
Lembar Pengesahan	12

LAPORAN PROGRESS PEKERJAAN

A. Laporan Pekerjaan Minggu Ke – 1 dan Minggu Ke – 2

Pada minggu ke – 1 dan ke – 2 kami melakukan konfirmasi standar material – material yang digunakan kepada konsultan pengawas dan melakukan pembelian material – material tersebut. Setelah beberapa material sudah tersedia, kami memulai dengan melakukan pembuatan kerangka untuk masing – masing barang sesuai dengan gambar kerja.

Berikut tabel pencapaian pekerjaan untuk minggu ke – 1 dan minggu ke – 2 :

No.	NAMA PEKERJAAN / BARANG	SATUAN	JUMLAH	RANGKA	FINISH ON WORKSHOP	ON SITE	ASSY ON SITE	PROGRESS
1	Meja Receptionis (A1)	Unit	1	V				25%
2	Sofa L (A2)	Unit	1					0 %
3	Pouffe (A3 & A4)	Unit	5					0 %
4	Wall Treatment 1 (A6)	m2	18.8					0 %
5	Wall Treatment 2 (A7)	m2	30.7					0 %
6	Meja Kerja Bulat (D3)	Unit	1					0 %
7	Cabinet A (D4)	Unit	2					0 %
8	Meja Segitiga (D6)	Unit	1					0 %
9	Credenza (D8)	Unit	1	V				25%
10	Meja Kerja Staff (D10)	Unit	2					0 %
11	Cabinet Storage (D10-1)	Unit	4	V				25%
12	Kisi-Kisi Part 1 (D17)	m2	15.6	V				25%
13	Kisi-Kisi Part 2 (D17)	m2	10.89	V				25%
14	Meja Meeting (F1)	unit	1					0 %
15	Wall Fixture with Glass Board (F3)	unit	2	V				25%
16	Kitchenset (G1)	unit	1					0 %
17	Meja Makan (G3)	unit	1					0 %
18	Rumput Sintetis	m2	24					0 %
19	Meja Satpam (M1)	unit	1	V				25%

Berikut dokumentasi progress pekerjaan pada minggu ke – 1 dan minggu ke – 2 :



Pengukuran Material



Pengecekan Kode HPL



Sample Material



Proses Pembuatan Rangka Barang

B. Laporan Pekerjaan Minggu Ke – 3 dan Minggu Ke – 4

Pada minggu ke – 3 dan ke – 4 kami melanjutkan pembuatan kerangka barang yang lainnya serta melakukan pemasangan HPL untuk beberapa barang yang sudah siap rangka utamanya serta melakukan finishing barang di workshop sebelum barang tersebut dikirim ke lokasi dengan melakukan pengecekan ukuran barang yang dibuat sudah sesuai dengan gambar kerja.

Berikut tabel pencapaian perkerjaan untuk minggu ke – 3 dan minggu ke – 4 :


No.	NAMA PEKERJAAN / BARANG	SATUAN	JUMLAH	RANGKA	FINISH ON WORKSHOP	ON SITE	ASSY ON SITE	PROGRESS
1	Meja Receptionis (A1)	Unit	1	V				25%
2	Sofa L (A2)	Unit	1					0 %
3	Pouffe (A3 & A4)	Unit	5					0 %
4	Wall Treatment 1 (A6)	m2	18.8					0 %
5	Wall Treatment 2 (A7)	m2	30.7					0 %
6	Meja Kerja Bulat (D3)	Unit	1	V				25 %
7	Cabinet A (D4)	Unit	2	V				25 %
8	Meja Segitiga (D6)	Unit	1	V				25 %
9	Credenza (D8)	Unit	1	V	V			50%
10	Meja Kerja Staff (D10)	Unit	2	V				25 %
11	Cabinet Storage (D10-1)	Unit	4	V	V			50%
12	Kisi-Kisi Part 1 (D17)	m2	15.6	V	V			50%
13	Kisi-Kisi Part 2 (D17)	m2	10.89	V	V			50%
14	Meja Meeting (F1)	unit	1	V				25 %
15	Wall Fixture with Glass Board (F3)	unit	2	V	V			50%
16	Kitchenset (G1)	unit	1	V				25 %
17	Meja Makan (G3)	unit	1	V				25 %
18	Rumput Sintetis	m2	24					0 %
19	Meja Satpam (M1)	unit	1	V	V			50%

Berikut dokumentasi progress pekerjaan pada minggu ke – 3 dan minggu ke – 4 :





Proses Penempelan HPL

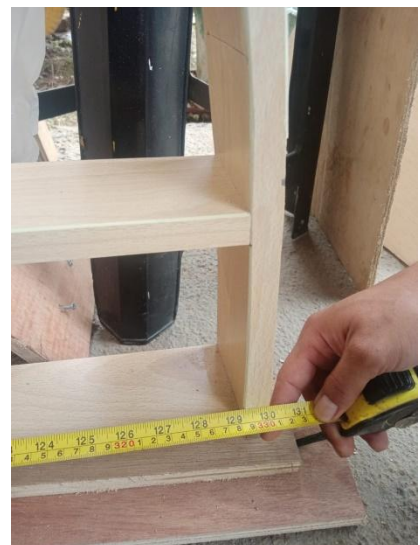

Proses Pengecekan Ukuran

C. Laporan Pekerjaan Minggu Ke – 5 dan Minggu Ke – 6

Pada minggu ke – 5 dan ke – 6 kami masih melanjutkan pembuatan kerangka barang yang lainnya serta melakukan pemasangan HPL untuk beberapa barang yang sudah siap rangka utamanya serta melakukan finishing barang di workshop sebelum barang tersebut dikirim ke lokasi. Selain itu juga sudah mengirimkan beberapa barang yang sudah selesai di workshop ke lokasi gedung diskominfo jawa tengah.

Berikut tabel pencapaian perkerjaan untuk minggu ke – 5 dan minggu ke – 6 :

No.	NAMA PEKERJAAN / BARANG	SATUAN	JUMLAH	RANGKA	FINISH ON WORKSHOP	ON SITE	ASSY ON SITE	PROGRESS
1	Meja Receptionis (A1)	Unit	1	V	V			50%
2	Sofa L (A2)	Unit	1	V				25 %
3	Pouffe (A3 & A4)	Unit	5	V				25 %
4	Wall Treatment 1 (A6)	m2	18.8	V				25 %
5	Wall Treatment 2 (A7)	m2	30.7	V				25 %
6	Meja Kerja Bulat (D3)	Unit	1	V	V			50 %
7	Cabinet A (D4)	Unit	2	V	V	V		75 %
8	Meja Segitiga (D6)	Unit	1	V	V			50 %
9	Credenza (D8)	Unit	1	V	V	V		75%
10	Meja Kerja Staff (D10)	Unit	2	V	V	V		75 %
11	Cabinet Storage (D10-1)	Unit	4	V	V	V		75%
12	Kisi-Kisi Part 1 (D17)	m2	15.6	V	V	V		75%
13	Kisi-Kisi Part 2 (D17)	m2	10.89	V	V	V		75%
14	Meja Meeting (F1)	unit	1	V				25 %
15	Wall Fixture with Glass Board (F3)	unit	2	V	V	V		75%
16	Kitchenset (G1)	unit	1	V	V			50 %
17	Meja Makan (G3)	unit	1	V	V	V		75 %
18	Rumput Sintetis	m2	24					0 %
19	Meja Satpam (M1)	unit	1	V	V	V		75%

Berikut dokumentasi progress pekerjaan pada minggu ke – 5 dan minggu ke – 6 :



Proses Pembuatan Rangka dan Finishing HPL



Proses Pengiriman Dan Penempatan Sementara Di Lokasi Diskominfo Jawa Tengah


D. Laporan Pekerjaan Minggu Ke – 7 dan Minggu Ke – 8

Pada minggu ke – 7 dan ke – 8 ada beberapa perubahan addendum di lapangan karena ada barang yang butuh support ekstra dalam pemasangannya. Kami juga melakukan finishing untuk beberapa barang yang belum selesai, agar dapat segera diselesaikan bersamaan dengan beberapa barang yang mengalami perubahan addendum. Kami juga sudah mulai melakukan pemasangan barang – barang yang sudah siap untuk dipasang di lokasi Diskominfo Jawa Tengah.




Berikut tabel pencapaian perkerjaan untuk minggu ke – 7 dan minggu ke – 8 :

No.	NAMA PEKERJAAN / BARANG	SATUAN	JUMLAH	RANGKA	FINISH ON WORKSHOP	ON SITE	ASSY ON SITE	PROGRESS
1	Meja Receptionis (A1)	Unit	1	V	V	V	V	100%
2	Sofa L (A2)	Unit	1	V	V	V	V	100 %
3	Pouffe (A3 & A4)	Unit	5	V	V	V	V	100 %
4	Wall Treatment 1 (A6)	m2	18.8	V	V	V	V	100 %
5	Wall Treatment 2 (A7)	m2	30.7	V	V			50 %
6	Meja Kerja Bulat (D3)	Unit	1	V	V	V		75 %
7	Cabinet A (D4)	Unit	2	V	V	V	V	100 %
8	Meja Segitiga (D6)	Unit	1	V	V	V	V	100 %
9	Credenza (D8)	Unit	1	V	V	V	V	100%
10	Meja Kerja Staff (D10)	Unit	2	V	V	V	V	100 %
11	Cabinet Storage (D10-1)	Unit	4	V	V	V	V	100 %
12	Kisi-Kisi Part 1 (D17)	m2	15.6	V	V	V	V	100 %
13	Kisi-Kisi Part 2 (D17)	m2	17.1	V	V	V	V	100 %
14	Meja Meeting (F1)	unit	1	V	V	V	V	100 %
15	Wall Fixture with Glass Board (F3)	unit	2	V	V	V	V	100 %
16	Kitchenset (G1)	unit	1	V	V	V	V	100 %
17	Meja Makan (G3)	unit	1	V	V	V	V	100 %
18	Rangka Typikal Gantungan kisi-kisi	kg	259.95	V	V	V	V	100 %

Berikut dokumentasi progress pekerjaan pada minggu ke – 7 dan minggu ke – 8 :

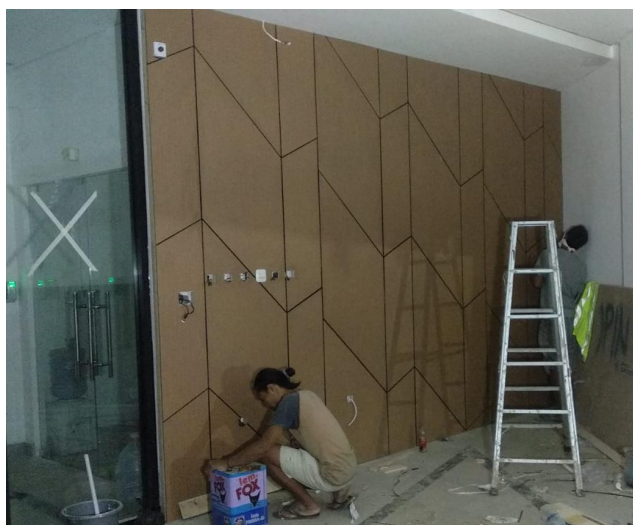

Proses Penempatan dan Perakitan di Diskominfo Jawa Tengah

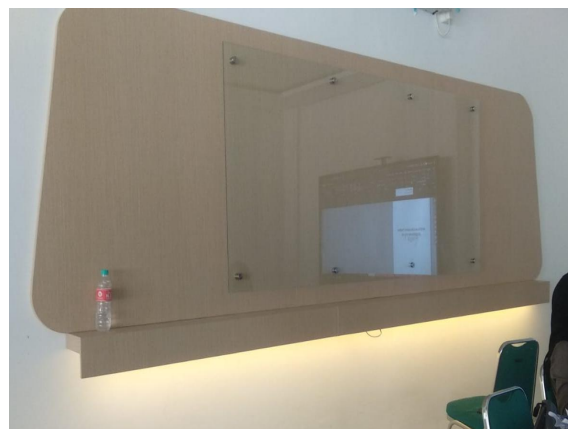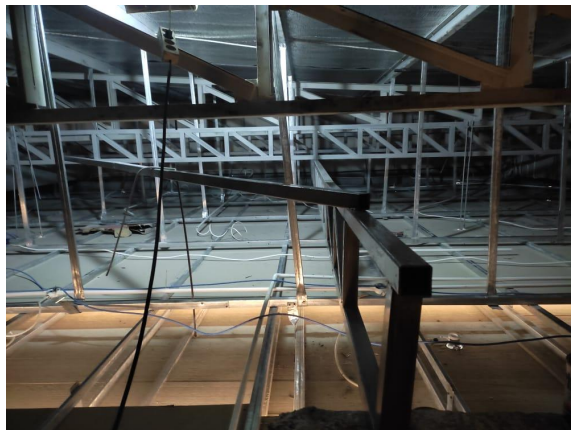

Proses Penempatan dan Perakitan di Diskominfo Jawa Tengah

E. Laporan Pekerjaan Minggu Ke – 9 dan Minggu Ke – 10

Pada minggu ke – 9 dan ke – 10 kami fokus untuk menyelesaikan barang – barang yang belum selesai untuk dipasang di lokasi Diskominfo Jawa Tengah.

Berikut tabel pencapaian pekerjaan untuk minggu ke – 9 dan minggu ke – 10 :

No.	NAMA PEKERJAAN / BARANG	SATUAN	JUMLAH	RANGKA	FINISH ON WORKSHOP	ON SITE	ASSY ON SITE	PROGRESS
1	Meja Receptionis (A1)	Unit	1	V	V	V	V	100%
2	Sofa L (A2)	Unit	1	V	V	V	V	100 %
3	Pouffe (A3 & A4)	Unit	5	V	V	V	V	100 %
4	Wall Treatment 1 (A6)	m2	18.8	V	V	V	V	100 %
5	Wall Treatment 2 (A7)	m2	30.7	V	V	V	V	100 %
6	Meja Kerja Bulat (D3)	Unit	1	V	V	V	V	100 %
7	Cabinet A (D4)	Unit	2	V	V	V	V	100 %
8	Meja Segitiga (D6)	Unit	1	V	V	V	V	100 %
9	Credenza (D8)	Unit	1	V	V	V	V	100%
10	Meja Kerja Staff (D10)	Unit	2	V	V	V	V	100 %
11	Cabinet Storage (D10-1)	Unit	4	V	V	V	V	100 %
12	Kisi-Kisi Part 1 (D17)	m2	15.6	V	V	V	V	100 %
13	Kisi-Kisi Part 2 (D17)	m2	17.1	V	V	V	V	100 %
14	Meja Meeting (F1)	unit	1	V	V	V	V	100 %
15	Wall Fixture with Glass Board (F3)	unit	2	V	V	V	V	100 %
16	Kitchenset (G1)	unit	1	V	V	V	V	100 %
17	Meja Makan (G3)	unit	1	V	V	V	V	100 %
18	Rangka Typikal Gantungan kisi-kisi	kg	259.95	V	V	V	V	100 %


Berikut dokumentasi progress pekerjaan pada minggu ke – 9 dan minggu ke – 10 :




Pouffe



Sofa

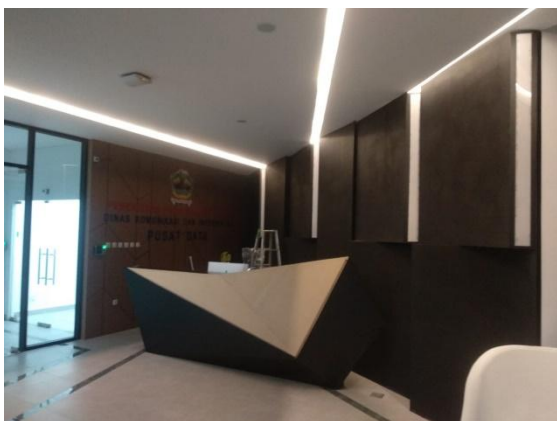

Meja Resepsionis, Wall Treatment 1 & 2

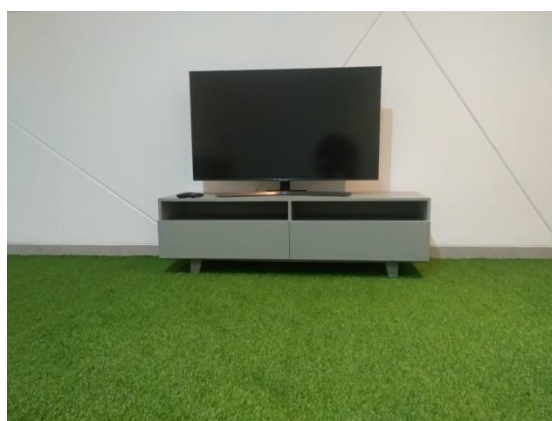

Credenza



Meja Meeting



Meja Kerja Bulat



Cabinet A



Meja Segitiga



Meja Kerja Staff & Cabinet Storage



Kisi – Kisi Part 1 & Part 2




Kitchen Set



Meja Makan



Wall Fixture With Glass Board

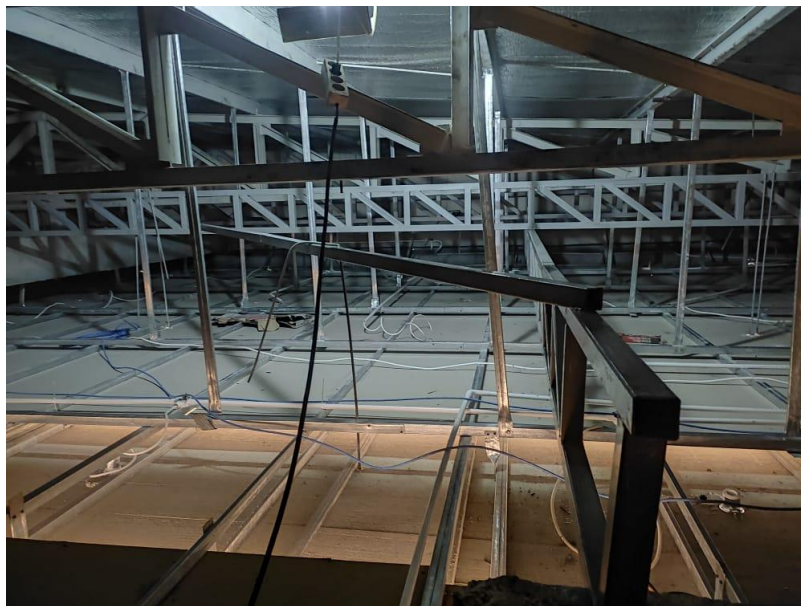

Rangka Kremona Support Kisi – kisi

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,

Diperiksa dan Disetujui

Diajukan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Pengawas

Penyedia

Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah

PT. Mataram Surya Cipta

CV Imaza Sabda Perkasa



Akhmad Syaifillah, ADT, MT
NIP. 19660425 198803 1 006



Miduk Situmeang, ST
Manager Proyek



Anggoro Kurniawan
Project Manager
